

福島県(避難区域を除く)における災害廃棄物等の処理進捗状況

H27.3.27 環境省

(1) 災害廃棄物について(平成27年2月末現在)

- 福島県(内陸部を含む)全体で、39市町村のうち、34市町村で災害廃棄物の処理完了(推計量の96%を完了)。
- 沿岸5市町で、災害廃棄物の処理が約155万トン、93%完了。うち、これまでに処理を実施した災害廃棄物の再生処理量は、約126万トンで、その割合は81%。
- 新地町で災害廃棄物の処理が完了。
- 相馬市及びいわき市で、災害廃棄物の仮置場への搬入が完了。



H24.3.21撮影



H27.3.12撮影

仮置場の解消事例(福島県いわき市)


(2) 津波堆積物について(平成27年2月末現在)

- 沿岸5市町で、津波堆積物の処理が約131万トン、96%完了。うち、津波堆積物の再生処理量は、約124万トンで、その割合は95%。
- 新地町及び相馬市で津波堆積物の処理が完了。
- 広野町及びいわき市で、津波堆積物の仮置場への搬入が完了。

(3) 国の代行処理について

災害廃棄物処理特別措置法に基づき、4市町から災害廃棄物(可燃物)の代行処理の要請を受け、国が処理を実施中。

- 新地町:平成26年3月に仮設焼却炉(相馬市に設置)における可燃物の処理を完了。
- 相馬市:平成26年11月に仮設焼却炉(相馬市に設置)における可燃物の処理を完了。
- 広野町:仮設減容化処理施設の建設工事中。平成27年6月から処理開始予定。
- 南相馬市:平成27年1月に、仮設減容化処理施設における代行処理業務について契約。

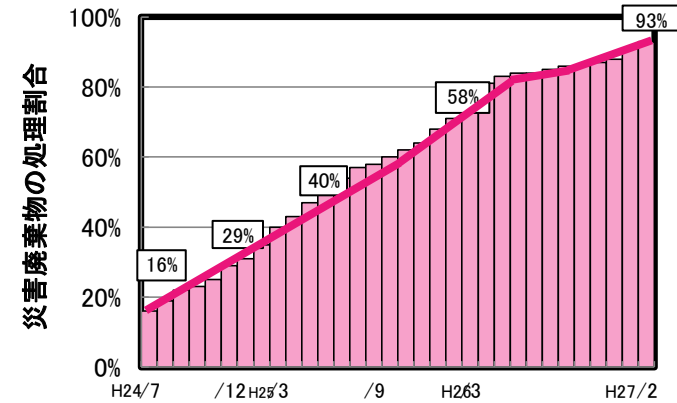

福島県沿岸市町村の災害廃棄物の処理実績

()内は前月の数値 平成27年2月末現在

	災害廃棄物等推計量(万トン)	災害廃棄物			津波堆積物			仮置場設置数
		推計量(万トン)	処理		推計量(万トン)	処理		
			量(万トン)	割合(%)		量(万トン)	割合(%)	
沿岸5市町	304	167	155 (151)	93 (91)	137	131 (129)	96 (94)	13 (14)
福島県全体	410	273	262 (258)	96 (94)	(沿岸5市町のみ)			14 (16)

沿岸市町毎の災害廃棄物等の処理状況

市町名	災害廃棄物等推計量(千t)	災害廃棄物										津波堆積物							
		推計量(千t)	仮置場への搬入		処理								推計量(千t)	仮置場への搬入		処理			
			量(千t)	割合(%)	仮置場設置数	処理量 ^{注1)} (千t)	再生処理量 ^{注2)} (千トン)	焼却(燃料利用)(千トン)	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	割合(%)	量(千t)		割合(%)	処理量 ^{注1)} (千t)	再生処理量 ^{注2)} (千トン)	埋立処理量(千トン)	割合(%)	
新地町	150	126	126	100	0	126	106	1	18	1	100	24	24	100	24	24	0	100	
相馬市	780	297	297	100	2	297	227	0	68	2	99.8	483	483	100	483	483	0	100	
南相馬市(避難区域を除く) ^{注3)}	1,113	507	493	97.2	6	413	380	0	1	32	81.5	606	554	91.4	554	554	0	91.4	
広野町 ^{注3)}	60	55	54	96.8	1	32	30	0	1	1	58.6	5	5	100	1	1	0	28.3	
いわき市	937	683	683	100	4	683	518	0	20	145	99.9	254	254	100	252	174	78	99.1	
5市町計	3,040	1,669	1,653	99.0	13	1,551	1,261	1	108	181	93.0	1,371	1,319	96.2	1,314	1,236	78	95.8	

注1)処理量:破碎・選別等により有価売却、焼却、埋立処分等により処理(再生利用するために処理されて資材として保管しているものを含む)された量。

注2)再生処理量:チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。

注3)広野町と南相馬市については、選別後の可燃物について、国が代行処理することとなり、現在仮設処理施設の設置に向けて準備中であり、処理施設での処理が開始するまで未処理。

平成27年2月末現在

	災害廃棄物			津波堆積物		
	家屋解体	仮置場搬入	処理	仮置場搬入	処理	再生利用先の調整等
新地町	完了	完了	・完了	完了	完了	・防災緑地で使用済。
相馬市	完了	完了	・不燃物:破碎・選別処理中 ・可燃物:11月末に処理完了	完了	完了	・県の防災林造成事業、事業用地造成事業での使用に向けて調整中。
南相馬市(避難区域を除く)	2,039件のうち、1,809件の解体を完了	継続中	・不燃物:破碎・選別処理中(市で選別機の増加に向けて調整中) ・選別された可燃物:国で設置する仮設焼却炉で処理予定(平成28年処理開始に向けて準備中)	継続中	選別処理中	・市の海岸防災林造成事業で使用予定。
広野町	残り11件	継続中	・不燃物:破碎・選別処理中 ・可燃物:国の代行による仮設減容化処理施設で処理予定。施設は建設工事中	完了	選別処理中	・県の防災緑地での使用に向けて調整中。 ・一部を除染廃棄物置場整地に使用。
いわき市	完了	完了	・不燃物等の処理を実施中	完了	選別処理中	・県の防災緑地整備事業で使用。
