

災害廃棄物等処理の進捗状況(3県沿岸市町村)(概要)



3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))

H25.9.27環境省

(1) 災害廃棄物について

- 災害廃棄物処理の進捗状況(平成25年8月末現在)
岩手県:75%、宮城県:88%、福島県:57% (3県:82%)
- 3県の処理割合が8割を超過。宮城県は88%で1ヶ月早く、9月末時点での処理見込み割合87%を超過。
- 推計量の約4分の3を占める沿岸市町村で8割を超える処理割合となるなど、着実に処理が進捗。

進捗状況	市町村等
処理完了	利府町、松島町
9割以上	洋野町、普代村、田野畑村、岩泉町、仙台市、亶理名取ブロック
8割以上	野田村、釜石市、気仙沼ブロック、石巻ブロック、宮城東部ブロック、いわき市
7割以上	宮古市、大槌町、大船渡市、陸前高田市

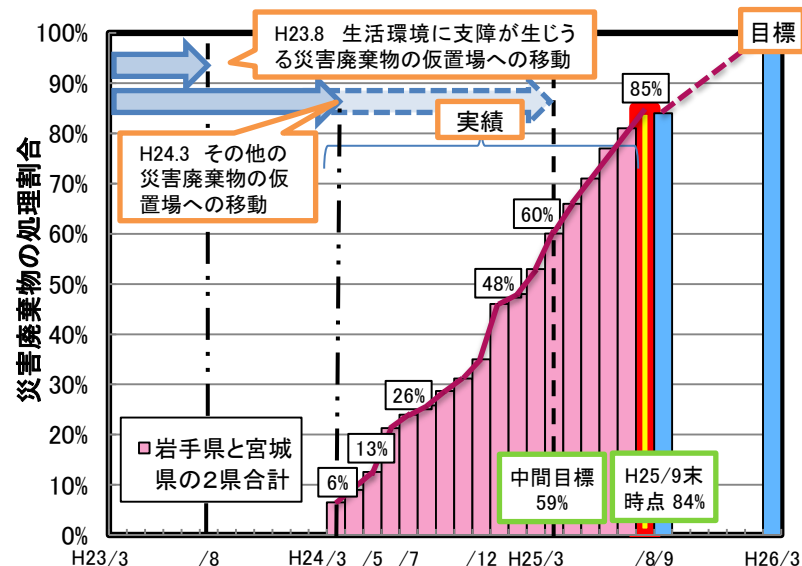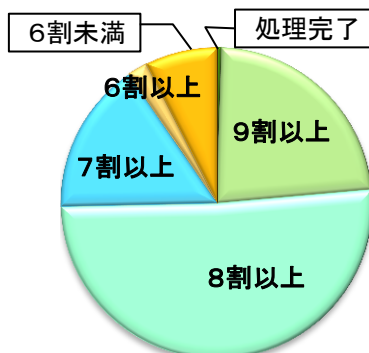

岩手県・宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の処理目標と実績

(2) 津波堆積物について

- 津波堆積物処理の進捗状況(平成25年8月末現在)
岩手県:53%、宮城県:71%、福島県:33% (3県:62%)
- 3県の処理割合が6割を超過。岩手県、宮城県とも着実に処理が進捗しており、9月末時点での処理割合に達する見込み。

○3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の処理状況(平成25年8月末現在)

	災害廃棄物等推計量(万t)	災害廃棄物				津波堆積物				仮置場設置数
		推計量(万t)	処理			推計量(万t)	処理			
			量(万t)	割合(%)	9月末時点(%)		量(万t)	割合(%)	9月末時点(%)	
岩手県	527	376	281(261)	75(69)	78	151	81(66)	53(44)	56	38
宮城県	1,766	1,061	936(910)	88(86)	87	705	502(450)	71(64)	76	51
福島県	337	171	97(93)	57(54)	—	166	55(50)	33(30)	—	29
合計	2,630	1,608	1,314(1,263)	82(79)	—	1,022	637(566)	62(55)	—	118

※ ()内は平成25年7月末の数値。

被災地における処理

- 災害廃棄物の仮置場への搬入率は94%、14市町村で搬入完了。仮置場の設置数は118箇所(37%)に減少。残りの解体・搬入は、目標期間内に処理完了できるように調整しつつ、実施中。
- 岩手県・宮城県・福島県で32基の仮設焼却炉、23箇所の破碎・選別施設が稼働中。宮城県気仙沼処理区小泉地区では8月末で可燃物の処理を終えた。

広域処理

- 9月12日より、神奈川県南足柄市及び箱根町で岩手県洋野町の漁具・漁網の受入が開始。
- その結果、広域処理必要量約66万トンに対し、すべて受入実施に移行済み。実施件数は1都1府16県85件。うち約48万トン処理済みで、60件は受入完了。
- 岩手県宮古地区からの可燃物について、群馬県及び大阪府での受入を9月上旬までに終了。
- その結果、自治体のごみ焼却施設における可燃物の広域処理はすべて完了(1都1府10県35件)。

今後の方針

- 岩手県・宮城県の災害廃棄物等について、目標期間(本年度)内で、できるだけ早期の処理完了を目指し、着実な処理を推進。
- 福島県の災害廃棄物等については、目標期間内に仮置場への搬入完了を目指すと共に、本年度末までの処理を可能な限り進め、平成26年度のできるだけ早期の処理完了を目指す。

再生利用等

- 岩手県野田村の都市公園事業整備工事において、コンクリートくずの利用開始。
- 岩手県宮古市の高浜地区海岸災害復旧工事において、コンクリートくずの利用開始。
- 災害廃棄物由来の再生資材を活用する公共事業(国、被災県・市町村)の調整先を概ね確保。



岩手県野田村の都市公園事業整備工事

災害廃棄物由来の再生資材を利用している主な公共事業

	事業	再生資材	利用量(万トン) (予定含む)
岩手県	海岸・河川堤防復旧事業	コンクリートくず	16
	海岸防災林復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず	17
	圃場整備事業	津波堆積物 コンクリートくず	65
	公園整備事業	津波堆積物	21
	漁港復旧事業	コンクリートくず	15
	仮置場造成事業	コンクリートくず	32
	その他事業	津波堆積物 コンクリートくず	80
宮城県	海岸・河川堤防復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず	64
	海岸防災林復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず	109
	圃場整備事業	津波堆積物 コンクリートくず	15
	公園整備事業	津波堆積物 コンクリートくず等	225
	漁港復旧事業	コンクリートくず	28
	仮置場造成事業	コンクリートくず	83
	その他事業	津波堆積物 コンクリートくず	123
福島県	海岸・河川堤防復旧事業	コンクリートくず	9
	公園整備事業	津波堆積物	16
	その他	コンクリートくず	11
